

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

**ОТЧЕТ**  
**О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ**  
**ПРОГРАММЫ АО «ДВК» за 2024г.**

Дзержинск 2025г.

**Информация о фактическом объеме инвестиций Конcessionонера в объект концессионного Соглашения  
и иное имущество в результате выполнения работ по реконструкции  
(созданию, модернизации, автоматизации) за 2024г.**

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) в т.ч.: 2024г.	Примечание
		Мероприятия в сфере водоснабжения			57 734 439,69		
		Городской водозабор (ГВЗ)			229 153,00		
1.	4.13. 4.13.4.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций Объекты основной производственной площадки <ul style="list-style-type: none"> <li>• проектные работы;</li> <li>• реконструкция (строительные работы) ограждений;</li> <li>• замена окон и дверей в зданиях по периметру объектов, в зданиях критических элементов, на КПП;</li> <li>• монтаж охранного освещения;</li> <li>• монтаж охранной сигнализации;</li> <li>• монтаж системы охранной телевизионной;</li> <li>• монтаж источников бесперебойного электроснабжения;</li> <li>• пуско-наладочные работы.</li> </ul>	2019г.-2028г.	Здание базы управления (инв. № 10046) <i>увеличение первоначальной стоимости</i>	229 153,00	Выполнено частично в сумме 12 071 610,80 руб., в т.ч.: 2019г.- 940,5 2020г.- 4 157,8 2021г.- 1 346,0 2022г.- 5 671,9 2023г.- 1 054,4 2024г.- 229,2  2020г.- 2 793 205,70 руб. 2021г.- 1 376 637,27 руб. 2022г.- 5 671 905,00 руб. 2023г.- 1 060 234,44 руб. 2024г.- 229,2	



№ п/п	№ пункта Инвести- ционной программы на 2014г. -2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструируе- мые (реконструируе- мые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) корректи- ровка 2024г.	Примечание
		<b>Объекты системы водоснабжения, расположенные в городской черте</b>			36 009 213,77		
2.	3.20.	<p>Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• устройство переходов под автомобильными дорогами;</li> <li>• монтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж запорной арматуры и вантузов;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• монтаж датчиков давления;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> <li>• монтаж приборов учета воды;</li> <li>• подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;</li> <li>• пуско-наладочные работы и испытания трубопровода.</li> </ul>	2018г.- 2028г.	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска (инв.№ 9823) /увеличение первоначальной стоимости/	12 375 383,93  (участок водопровода г. Дзержинска ул. Студенческая, 59 – пр-т Ленина, 105, от ВК-123-4 до ВК-130-24а (перемычка от ВК-123-22а до т.А1))	493 377,1 в т.ч.: 2018г.- 11 998,2 2019г.- 25 389,6 2020г.- 39 857,0 2021г.- 57 305,2 2022г.- 38 839,6 2023г.- 64 930,0 2024г.- 12 375,4	Выполнено частично в сумме 257 177 768,43 руб., в т.ч.: 2018г.- 11 998 176,14 руб. 2019г.- 25 406 002,00 руб. 2020г. - 46 323 407,16 руб. 2021г.- 57 305 243,52 руб. 2022г.- 38 839 583,09 руб. 2023г.- 64 929 972,59 руб.

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) в т.ч.:	Примечание
3.	3.23.	<p>Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• демонтаж старых насосов внутри насосной станции;</li> <li>• демонтаж/тампонаж старых трубопроводов;</li> <li>• демонтаж старой запорной арматуры;</li> <li>• демонтаж старых электрокабелей;</li> <li>• демонтаж старого электрооборудования;</li> <li>• монтаж насосного оборудования внутри насосной станции;</li> <li>• монтаж запорной арматуры внутри насосной станции;</li> <li>• прокладка кабелей энергоснабжения насосной станции;</li> <li>• подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• монтаж запорной арматуры и вентузов;</li> <li>• монтаж электрооборудования;</li> <li>• монтаж силовых шкафов и управления, монтаж датчиков давления;</li> </ul>	2021г.-2028г.	<p>Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств</p>	23 633 829,84 в т.ч.:	<p>376 482,7 в т.ч.:</p> <p>2021г. - 2 827,8</p> <p>2022г.- 30 409,0</p> <p>2023г.- 20 436,8</p> <p>2024г. - 23 633,0</p>	<p>Выполнено частично в сумме 77 307 301,44 руб., в т.ч.:</p> <p>2021г.- 2 827 760,00 руб.</p> <p>2022г.- 30 408 960,60 руб.</p> <p>2023г.- 20 436 751 руб.</p>



№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструированные) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) 2024г.	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж приборов учета воды;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• разработка программного обеспечения;</li> <li>• автоматизация работы насосных агрегатов;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания.</li> </ul>					
		<b>Объекты системы водоснабжения, расположенные за пределами городской черты</b>			21 496 072,92		
4.	3.18.	<p>Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• разработка рабочей документации и проекта производства работ;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• устройство переходов под автомобильными дорогами;</li> <li>• монтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	2022г.-2027г.	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра (инв.№_9826) /увеличение первоначальной стоимости/	8 688 039,34	32 817,8 в т.ч.:  2022г.- 2 809,8  2023г.- 6 320,0  2024г.- 8 688,04	Выполнено частично в сумме 17 817 790,14 руб., в т.ч.:  2022г.- 2 809 750,80 руб.  2023г.- 6 320 000,00 руб.

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) 2024г.	Примечание
5.	2.2.	<p>Строительство второй нитки Тепловского водозабора</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж камер;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	2018г. - 2024г.	Вторая нитка Тепловского водозабора (инв. № 00-00557)	11 027 353,39	<p>30 876,3 в т.ч.:</p> <p>2018г. – 14 974,1</p> <p>2019г. – 2 095,2</p> <p>2020г. – 2 779,6</p> <p>2024г. – 11 027,4</p>	<p>Выполнено в сумме 31 803 816,54 руб., в т.ч.:</p> <p>2018г. – 15 533 509,09 руб.</p> <p>2019г. – 2 455 906,91 руб.</p> <p>2020г. – 2 787 047,15 руб.</p>
6.	2.6.	<p>Строительство водовода на п. Пыра. Вторым этапом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопровода;</li> <li>• монтаж камер;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	2024г.	Водовод на п. Пыра (инв. № 00-00558)	1 780 680,19	1 780,7	Выполнено



№ п/п	№ пункта Инвести- ционной програм- мы на 2014г. -2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструиру- емые (реконструируе- мые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объ- ем инвестиций, (тыс.руб.) коррек- тировка 2024г.	Примечание
		Мероприятия в сфере водоотведения			58 882 685,38		
		Районные очистные сооружения (РОС)			17 694 096,34		
7.	3.1.	Реконструкция Районных очистных со- оружений (РОС) <ul style="list-style-type: none"><li>• проведение инженерных изысканий;</li><li>• проектные работы;</li><li>• строительство приемной камеры;</li><li>• монтаж запорной арматуры (шиберов);</li><li>• строительство каналов;</li><li>• монтаж перфорированных решеток тонкой очистки;</li><li>• монтаж промывного пресса для отбросов;</li><li>• монтаж конвейера выгрузки и сбора отбросов с блока механической очистки стоков;</li><li>• монтаж павильонов для размещения оборудования;</li><li>• строительство песколовок;</li></ul>	2016г.- 2032г.	Агрегат воздушный с обвязкой №5 /увеличение первоначальной стоимости/  Приборы и средства автома- тической системы водоотве- дения корпус 150 (инв. № 9787)  Коммуникации (инв. № 130723) /увеличение первоначальной стоимости/	14 800 586,34 в т.ч.  971 774,40  468 680,00  7 430 473,00	1 285 871,9 в т.ч.:  2016г.- 70 525,0  2017г.- 60 678,6  2018г.- 83 915,3  2019г.- 28 002,3  2020г.- 23 350,0  2021г. - 21 785,2	Выполнено частично в сумме 370 289 535,07 руб., в т.ч.:  2016г.- 70 525 000 руб.  2017г.- 60 858 563,05 руб.  2018г.- 83 915 391,02 руб.

№ п/п	№ пункта Инвести- ционной программы на 2014г. -2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструиру- емые (реконструируе- мые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж установки для промывки, обезжелезивания и удаления песка;</li> <li>• демонтаж трубопроводов;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• строительство камер для переключения и размещения оборудования;</li> <li>• демонтаж кабелей электропитания;</li> <li>• монтаж (прокладка) кабелей электропитания;</li> <li>• монтаж приборов и датчиков;</li> <li>• монтаж шкафов управления, силовых и автоматики;</li> <li>• монтаж систем вентиляции;</li> <li>• создание системы аварийного сброса;</li> <li>• создание системы автоматизированного управления работой сооружений, оборудования и передачи телеметрической информации;</li> <li>• монтаж площадок и подъездных путей для складирования и вывоза отбросов, песка и осадка;</li> <li>• монтаж оборудования по обработке осадка;</li> <li>• монтаж навеса для обеспечения работы оборудования;</li> </ul>		Трубы стальные Д1000 К1 №3 (инв.№70300) <i>/увеличение первоначальной стоимости/</i>	5 929 658,94	2022г. - 36 497,1  2023г. - 28 948,5  2024г. - 14 799,3	2019г. - 28 002 290,44 руб.  2020г. - 24 780 058,72 руб.  2021г. - 21 841 212,64 руб.  2022г. - 36 506 435,89 руб.  2023г. - 29 059 996,97 руб.



№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструируемые (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• строительные работы (утепление зданий и замена оконных и дверных блоков, ворот зданий);</li> <li>• работы по математическому опытно-эксплуатационному моделированию технологических процессов глубокой биологической очистки сточных вод;</li> <li>• монтаж систем аэрации;</li> <li>• демонтаж насосного оборудования;</li> <li>• монтаж насосного оборудования;</li> <li>• монтаж воздушного оборудования;</li> <li>• демонтаж запорной арматуры;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• пуско-наладочные работы; приемочные испытания.</li> </ul>					

п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. - 2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
8.	3.4.	<p><b>Реконструкция коллекторов очищенных стоков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• разработка траншей;</li> <li>• демонтаж старых труб;</li> <li>• монтаж (прокладка) новых трубопроводов;</li> <li>• санация трубопроводов;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемные испытания трубопровода.</li> </ul>	<p>2016г.- 2020г</p> <p>2023г.- 2024г.</p> <p>2026г.- 2028г. 2032г.</p>	<p>Коллектора очищенных стоков K12, K13 (инв.№130160) (увеличение первоначальной стоимости)</p>	250 000,00	<p>102 658,0 в т.ч.:</p> <p>2016г. - 9 680,0</p> <p>2017г. - 23 917,32</p> <p>2018г. - 9 415,8</p> <p>2019г. - 4 473,6</p> <p>2020г. - 10 000,0</p> <p>2023г. - 787,0</p> <p>2024г. - 250,0</p>	<p>Выполнено частично в сумме 56 578 786,71 руб., в т.ч.:</p> <p>2016г. - 9 680 000,00 руб.</p> <p>2017г. - 23 917 258,41 руб.</p> <p>2018г. - 9 447 208,06 руб.</p> <p>2019г. - 4 473 632,00 руб.</p> <p>2020г. - 8 023 688,24 руб.</p> <p>2023г. - 787 000,00 руб.</p>



№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
9.	4.7 4.7.2	<p>Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций</p> <p>Объекты производственной площадки РОС</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проектные работы;</li> <li>• реконструкция (строительные работы) ограждений;</li> <li>• замена окон и дверей в зданиях по периметру объектов, в зданиях критических элементов, на КПП;</li> <li>• монтаж охранного освещения;</li> <li>• монтаж охранной сигнализации;</li> <li>• монтаж системы охранной телевизионной;</li> <li>• монтаж источников бесперебойного электроснабжения;</li> <li>• пуско-наладочные работы.</li> </ul>	<p>2019г.-2022г.</p> <p>2024г.</p> <p>2026г.-2028г.</p>	<p>Система охранной и телевизионной сигнализации с ИБЭС</p> <p>/объект незавершенного строительства/</p>	2 643 510,00	<p>28 978,5 в т.ч.:</p> <p>2019г.- 1 500,0</p> <p>2020г.- 3 680,0</p> <p>2021г.- 5 000,0</p> <p>2022г.- 2 055,0</p> <p>2024г.- 2 643,5</p>	<p>Выполнено частично в сумме 16 470 442,84 руб., в т.ч.:</p> <p>2019г.- 1 500 000,00 руб.</p> <p>2020г.- 5 271 937,15 руб.</p> <p>2021г.- 5 000 000,00 руб.</p> <p>2022г.- 2 054 995,69 руб.</p>

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
		<b>Объекты системы водоотведения, расположенные в городской черте</b>			40 188 757,55		
10.	2.3.	<p>Строительство главного канализационного коллектора</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• санация трубопроводов;</li> <li>• устройство переходов под железнодорожными путями Горьковской железной дороги;</li> <li>• устройство переходов под автомобильными дорогами;</li> <li>• монтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	<p>2016г.- 2024г.</p> <p>2032г.</p>	<p>Главный канализационный коллектор (инв. № 00-00545)</p>	<p>30 112 552,64</p> <p>(участок главного канализационного коллектора от ул. Удриса, д.11 до ул. Терешковой, д.4)</p>	<p>329 645,8 в т.ч.: 2016г.- 5 702,4 2017г.- 64 732,0 2018г.- 44 405,5 2019г.- 4 118,9 2020г.- 1 491,4 2021г.- 82 303,0 2022г.- 63 152,8 2023г.- 49 097,3</p>	<p>Выполнено в сумме 393 235 245,45 руб., в т.ч.: 2016г.- 5 702 389,36 руб. 2017г.- 66 593 567,27 руб. 2018г.- 51 620 616,42 руб. 2019г.- 5 559 692,60 руб.</p>



№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. - 2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
						2024г. – 14 642,44  2021г.- 84 779 858,36 руб.  2022г.- 76 152 998,05 руб.  2023г. – 65 647 970,35 руб.	2020г.- 7 065 600,40 руб.  2021г.- 84 779 858,36 руб.  2022г.- 76 152 998,05 руб.  2023г. – 65 647 970,35 руб.
11.	3.9.	Реконструкция канализационных сетей г. Дзержинска <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• санация трубопроводов;</li> <li>• устройство переходов под автомобильными дорогами;</li> <li>• демонтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж новых камер и колодцев;</li> <li>• перекачка стоков насосным оборудованием по обводным линиям;</li> </ul>	2018г.- 2032г.	Сети канализации (инв.№ 9822) <i>увеличение первоначальной стоимости</i>	10 076 204,91	492 075,9 в т.ч.:  2018г.- 18 008,6  2019г.- 64 425,7  2020г.- 119 253,6  2021г. - 20 043,4	Выполнено частично в сумме 247 436 107,98 руб., в т.ч.:  2018г.- 18 010 841,39 руб.  2019г.- 64 501 303,88 руб.

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2024г.	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"><li>• монтаж запорной арматуры;</li><li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li><li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li></ul>				2020г.- 1 111,3 2023г.- 6 652,8 2024г.- 10 075,9	2020г. – 127 040 226,24 руб. 2021г.- 20 043 366,56 руб. 2022г.- 1 111 320,00 руб. 2023г.- 6 652 845,00 руб.



№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2024г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) коррективом 2024г.	Примечание
		<b>Объекты системы водоотведения, расположенные за пределами городской черты</b>			999 831,49		
12.	3.12.	Реконструкция канализационных сетей п. Пыра <ul style="list-style-type: none"> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• монтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж запорной арматуры;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	2020г.-2024г.	Канализационные сети и выпуски р. п. Пыра (инв. № 00009827)	999 831,49	21 708,8 в т.ч.: 2020г.- 9 268,8 2022г.- 8 440,1 2023г.- 3 000,0 2024г.- 999,8	Выполнено в сумме 14 962 195,02 руб., в т.ч.: 2020г.- 2 522 218,80 руб. 2022г.- 8 440 144,73 руб. 2023г.- 3 000 000,00 руб.
		<b>ВСЕГО: объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, переданные в концессию</b>			116 617 125,07		

№ п/п	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструируемые (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2024г.	Примечание
	<u>Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение</u>			27 372 675,35	
1.	Строительство водопровода DN315 от повысительной станции №3 водопровода на промышленный парк «Дзержинск-Восточный» до границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000002:977 (до производственной площадки индустриального парка (2 очереди ОЭЗ ППТ «Кулибин») <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение инженерных изысканий;</li> <li>• проектные работы;</li> <li>• монтаж (прокладка) трубопроводов;</li> <li>• монтаж камер и колодцев;</li> <li>• монтаж запорной арматуры и вентузов;</li> <li>• врезка (подключение) в существующие сети;</li> <li>• пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.</li> </ul>	2024г.	Водопровод DN315 от повысительной насосной станции № 3 промышленного парка «Дзержинск-Восточный» до производственной площадки индустриального парка (2 очереди ОЭЗ ППТ «Кулибин») (инв. № 00-00556)	27 372 675,35	Выполнено
	<b>ВСЕГО инвестиции в 2024г.</b>			143 989 800,42	

Генеральный директор  
АО «ДВК»



А.И. Рехалов



**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
В ОТНОШЕНИИ ЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в 2024г.**

Наименование мероприятия: **Строительство второй нитки Тепловского водозабора**

Основание выполнения работ: *п.2.2 Инвестиционной программы на 2014г. – 2032г.  
(корректировка 2024г.)*

Инвентарные объекты:

**1. Вторая нитка Тепловского водозабора (участок сети хозяйственно-питьевого водопровода от камеры 46 до точки присоединения к трубопроводу Д900 в месте: УП129), инв. № 00-00557**

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж камеры;
- монтаж запорной арматуры;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Наименование мероприятия: **Строительство водовода на п. Пыра. Второй этап.**

Основание выполнения работ: *п.2.6. Инвестиционной программы на 2014г. –2032г.  
(корректировка 2024г.)*

Инвентарные объекты:

**1. Водовод на п. Пыра (инв. № 00-00558)**

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов;
- монтаж камеры;
- монтаж запорной арматуры;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Наименование мероприятия: **Строительство главного канализационного коллектора**

Основание выполнения работ: *п. 2.3. Инвестиционной программы на 2014г. –2032г.  
(корректировка 2024г.)*

Инвентарные объекты:

**1. Главный канализационный коллектор (участок главного канализационного коллектора от ул. Удриса, д.11 до ул. Терешковой, д.4.), инв. № 00-00545**

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов;
- устройство переходов под автомобильными дорогами, тротуарами, инженерными коммуникациями;
- монтаж камер и колодцев;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Наименование мероприятия: **Реконструкция канализационных сетей п. Пыра**

Основание выполнения работ: п.3.12. Инвестиционной программы на 2014г. –2032г. (корректировка 2024г.)

Инвентарные объекты:

**1. Канализационные сети и выпуски р.п. Пыра (инв. №00009827)**

Общее описание выполненных работ:

- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов;
- монтаж камер и колодцев;
- монтаж запорной арматуры;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Наименование мероприятия: **Строительство водопровода DN315 от повысительной насосной станции №3 водопровода на промышленный парк «Дзержинск-Восточный» до границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000002:977 (до производственной площадки индустриального парка (2 очередь ОЭЗ ППТ «Кулибин»))**

Основание выполнения работ: В рамках договора о подключении (технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения АО «ДВК»)

Инвентарные объекты:

**1. Водопровод DN315 (инв. № 00-00556)**

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов;
- монтаж камер и колодцев;
- монтаж запорной арматуры и вентузов;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Технический директор



С.Ю. Сафонов



Акционерное общество «Держинский Водоканал»

ФОТОМАТЕРИАЛЫ,  
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА  
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА  
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  
(СОЗДАНИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ)  
в 2024г.

Держинск 2025г.



# РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

## г. ДЗЕРЖИНСКА



**Прокладка трубопровода ул. Студенческая, 59 - пр. Ленина, 105  
(участок 14 от ВК-123-4 до ВК-130-24а)**



**Прокладка трубопровода ул. Студенческая, 59 - пр. Ленина, 105  
(участок 14 от ВК-123-4 до ВК-130-24а)**





**Прокладка трубопровода ул. Студенческая, 59 - пр. Ленина, 105  
(участок 14 от ВК-123-4 до ВК-130-24а)**



РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2 ПОДЪЕМА  
ПВОС



**Прокладка внутриплощадочных сетей фильтровальной воды ПВОС**





**Установка насосного оборудования с трубопроводами и запорной арматурой (здание №629 ПВОС)**



**Ремонт кровли на насосной станции (здание №629 производственное, ул. Сухаренко, 10 (инв.№5249))**



## СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ ТЕПЛОВСКОГО ВОДОЗАБОРА



**Строительство участка второй нитки Тепловского водозабора на территории производственной площадки АО «ДВК» по адресу: пр. Дзержинского, 43 (подключение к внутриплощадочным сетям)**





**Строительство участка второй нитки Тепловского водозабора на территории производственной площадки АО «ДВК» по адресу: пр. Дзержинского, 43 (подключение к внутриплощадочным сетям)**




## РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЙОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (РОС)



**Ведутся работы по прокладке трубопроводов и строительству камер  
внутриплощадочных коммуникаций РОС**



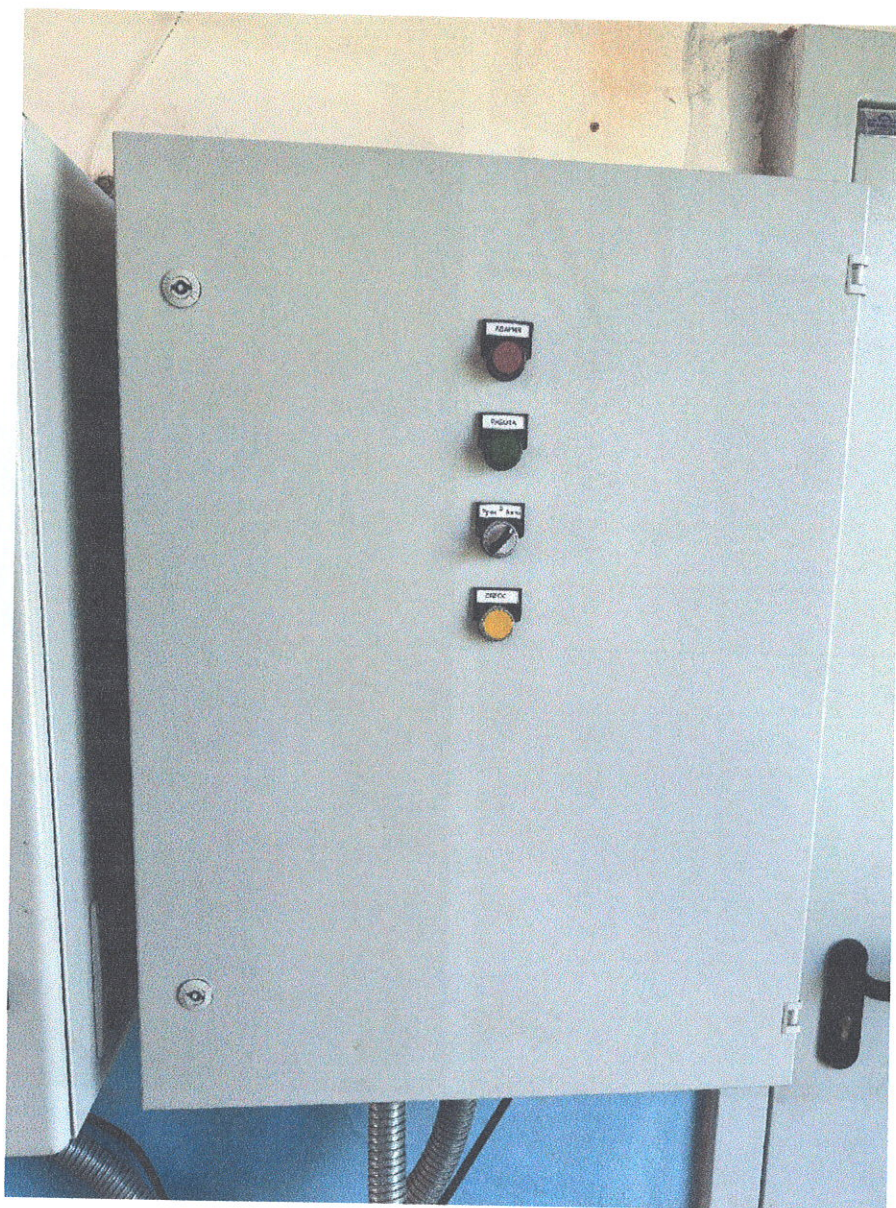

**Шкафы управления насосным оборудованием корпус 150 (инв.№ 9787)**






**Агрегат воздуходувный с обвязкой №5**



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ  
ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА  
И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
(объекты производственной площадки РОС)

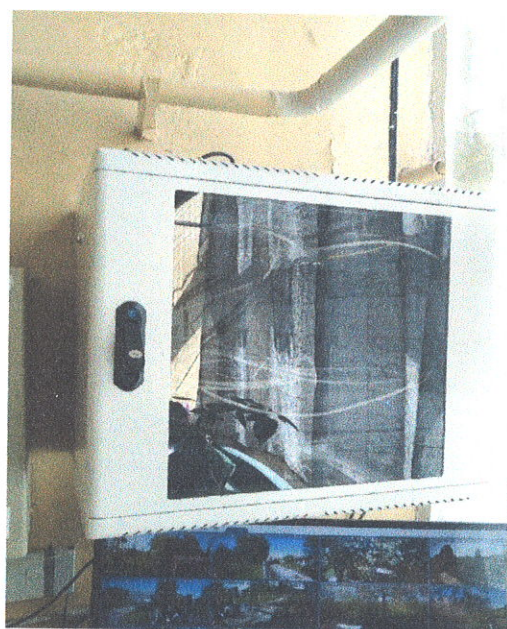

Оборудование системы охранной телевизионной сигнализации с ИБЭС в  
помещении службы охраны объекта водоотведения





**Камеры видеонаблюдения на критическом элементе объекта  
водоотведения**



## СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА



**Благоустройство территории после прокладки главного  
канализационного коллектора, участок ул. Р. Удриса д.11 до ул.  
Терешковой д.4)**





**Благоустройство территории после прокладки главного  
канализационного коллектора, участок ул. Р. Удриса д.11 до ул.  
Терешковой д.4)**



# РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

## г. ДЗЕРЖИНСКА



**Реконструкция (санация) канализационного коллектора по  
ул. Самохвалова**



**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА DN315 ОТ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №3 ВОДОПРОВОДА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ДЗЕРЖИНСК-ВОСТОЧНЫЙ» ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 52:21:0000002:977 (ДО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА (II ОЧЕРЕДЬ ОЭЗ ППТ «КУЛИБИН»))**



**Прокладка водопровода DN315 от повысительной насосной станции №3 промышленного парка «ДЗЕРЖИНСК-ВОСТОЧНЫЙ» до производственной площадки индустриального парка (II очередь ОЭЗ ППТ «КУЛИБИН»)**





**Прокладка водопровода DN315 от повысительной насосной станции №3  
промышленного парка «ДЗЕРЖИНСК-ВОСТОЧНЫЙ» до  
производственной площадки индустриального парка  
(II очередь ОЭЗ ПШТ «КУЛИБИН»)**
